LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN 2019-2022 CHUMBIVILCAS
Forjando el cambio....!

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2020-OCI/0386-SCC

CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ALTERNATIVO CAPITÁN FELIPE BERMÚDEZ EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO"

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

TOMO I DE I

SANTO TOMÁS, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2020-OCI/0386-SCC

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ALTERNATIVO CAPITÁN FELIPE BERMÚDEZ EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	N° Pág.
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVO	1
III.	ALCANCE	1
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE	2
V.	SITUACIÓN ADVERSA	2
	EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19, LA OBRA SE EJECUTA SIN PERSONAL CLAVE, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y GENERANDO EL RIESGO QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN SIN LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA Y CALIDAD PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	2
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE	6
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE DE SITUACIONES ADVERSAS	6
VIII.	INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	6
IX.	CONCLUSIÓN	7
X.	RECOMENDACIONES	7
	APÉNDICE	

INFORME DECONTROL CONCURRENTE N° 018-2020-OCI/0386-SCC

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ALTERNATIVO CAPITÁN FELIPE BERMÚDEZ EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en adelante la "Entidad", mediante oficio n.° 174-2020-MPCH/OCI de 18 de setiembre de 2020 y 207-2020-MPCH/OCI de 9 de octubre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con el código de orden de servicio n.° 0386-2020-019, que se realiza en el marco de las facultades asignadas a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control mediante Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificado con Resolución de Contraloría n.° 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020.

II. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Determinar si la ejecución dela obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas -Cusco", se realiza conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo Específico

Establecer si la ejecución de la obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco", se realiza con la presencia del personal clave propuesto en las estipulaciones contractuales.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se efectuó a la reanudación del proyecto: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas - Cusco", en el marco de la reactivación económica, y que ha sido ejecutado del 1 al 30 de octubre de 2020, en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

La Gerencia de Infraestructura de la Entidad, en el marco de la emergencia sanitaria y con el objetivo de cumplir con los objetivos trazados anualmente, es que realiza la reanudación de obras tales como la ejecución de obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco".

La obra se viene ejecutando por la empresa Consorcio Santo Tomas (conformada por San Agustin E.I.R.L. Contratistas Generales y Minería SRL y ABC Imperio Consultores Generales E.I.R.L.).

V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada a la ejecución del proyecto se ha identificado una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad de la obra, el resultado o el logro de los objetivos de la obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco", conforme se describe a continuación:

EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19, LA OBRA SE EJECUTA SIN PERSONAL CLAVE, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y GENERANDO EL RIESGO QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN SIN LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA Y CALIDAD PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

De las visitas efectuadas el 18 de setiembre y el 16 de octubre de 2020 a las instalaciones de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo Capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco", se advierte que su ejecución se realiza con profesional "Especialista en Seguridad de Obra", personal clave del contratista (Consorcio Santo Tomas), sin cumplir las condiciones que motivaron la selección del contratista (adjudicación de buena pro), lo cual genera el riesgo que los trabajos se realicen sin las condiciones de eficiencia y calidad previstas en el expediente técnico.

Lo descrito anteriormente se sustenta en lo siguiente:

De la Licitación Pública

La Entidad, el 30 de mayo de 2019, convocó al procedimiento de selección Licitación Pública n.° 1-2019-MPCH-1, por un valor estimado de S/ 9 172 919,79 para la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación del Centro Educativo Básico Alternativo Capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco".

En tal sentido, el 12 de agosto de 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro al Consorcio Santo Tomas (conformada por San Agustín E.I.R.L. con RUC n.° 20205328662 y ABC Imperio Consultores S.R.L. con RUC n.° 20490235613).

Es así que, de la revisión al expediente de contratación, en los términos de referencia se estableció la exigencia de personal clave, así como los requisitos respectivos, descritos a continuación:

CUADRO N° 1
EXIGENCIA DE PERSONAL CLAVE EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Ítem	Personal Clave	Experiencia
1	Residente de Obra	60 meses acumulados como residente/supervisor de obras iguales y/o similares.
2	Ingeniero Estructural	60 meses acumulados como especialista estructural de obras iguales y/o similares
3	Especialista en Seguridad de Obra	60 meses acumulados como especialista y/o ingeniero de seguridad de obras en general.
4	Especialista en Medio Ambiente	36 meses acumulados como especialista en medio ambiente de obras en general.
5	Especialista en Electricidad	72 meses acumulados como especialista en instalaciones eléctricas de obras en general
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	36 meses acumulados como especialista en ingeniería sanitaria de obras en general
7	Especialista en Mecánica de Suelos	80 meses acumulados como especialista en seguridad de obras en general.

Fuente: Expediente de contratación de la Licitación Pública n.° 1-2019-MPCH-1

En tal sentido, el referido consorcio para el cumplimiento de **Especialista en Seguridad de Obra,** ofertó al **ingeniero Wolfgang Augusto Gonzales Espinoza, con CIP n.° 50180;** sobre el particular, de la revisión a la documentación que sustenta la experiencia profesional, se advierte que cuenta con 71 meses, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2
EXPERIENCIA PROFESIONAL DE WOLFGANG AUGUSTO GONZALES ESPINOZA

N°	EMPLEADOR	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	TIEMPO ACUMULADO
1	Coanza C.G.SRL	Especialista en Seguridad de Obra	25/12/2002	22/12/2003	12 meses
2	M & M Ejecutores SRL		06/06/2005	16/08/2005	3 meses
3	Consorcio Angeles		01/04/2006	17/10/2006	6 meses
4	Consorcio Ocidesa SAC		09/11/2006	02/11/2007	12 meses
5	Consorcio Challhuanca		01/01/2008	20/07/2008	6 meses
6	Sami Construcciones C.G. SRL		04/08/2008	07/03/2009	8 meses
7	Coanza C.G.SRL		18/09/2010	17/11/2011	14 meses
8	Consorcio Esperanza		08/02/2016	25/11/2016	10 meses
			EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA		**71 MESES**

Fuente: Expediente de contratación de la Licitación Pública n.° 1-2019-MPCH-1

Sin embargo, el 14 de agosto de 2020, el Consorcio Santo Tomás con carta n.° 32-2020-CST/ RL, reitera a la Entidad, se emitan las resoluciones de cambio de especialistas propuestos (personal clave de obra), **entre ellos, de la especialista en seguridad de obra**, por la ingeniera Yesenia Delgado Huamani, con CIP n.° 198362.

Es así que, de la revisión a los documentos que sustentan la carta n.° 32-2020-CST/ RL, se observa que la, profesional Yesenia Delgado Huamani, **se tituló como ingeniera ambiental el 25 de noviembre de 2016** y se **incorporó al colegió de ingenieros del Perú el 22 de marzo de 2017**, conforme se aprecia en las siguientes imágenes:

IMAGEN N° 1
TITULO PROFESIONAL



EN NOMBRE DE LA NACIÓN

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

EL RECTOR por cuanto: la Facultad de **INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**
Escuela Profesional de: **INGENIERÍA AMBIENTAL** , en la
con fecha 27 de octubre de 2016 ; Resolvió declarar aprobado para optar el Título Profesional, de conformidad con la legislación universitaria vigente; a Don (ña):

YESENIA DELGADO HUAMANI

POR TANTO: le confiere el **Título Profesional de:**

INGENIERO AMBIENTAL

y le expide el presente DIPLOMA para que se le reconozca como tal con los derechos y prerrogativas de ley.

Lima, 25 de noviembre de 2016


Ing. IVON RIVERS ALCÁZAR PEREZ
SECRETARIA GENERAL

Dr. ENRIQUE OSWALDO BEDOYA SANCHEZ
RECTOR (e)

DECANO DE FACULTAD

Fuente: Carta n.° 32-2020-CST/RL

IMAGEN N° 2
HABILITACIÓN COLEGIO DE INGENIEROS

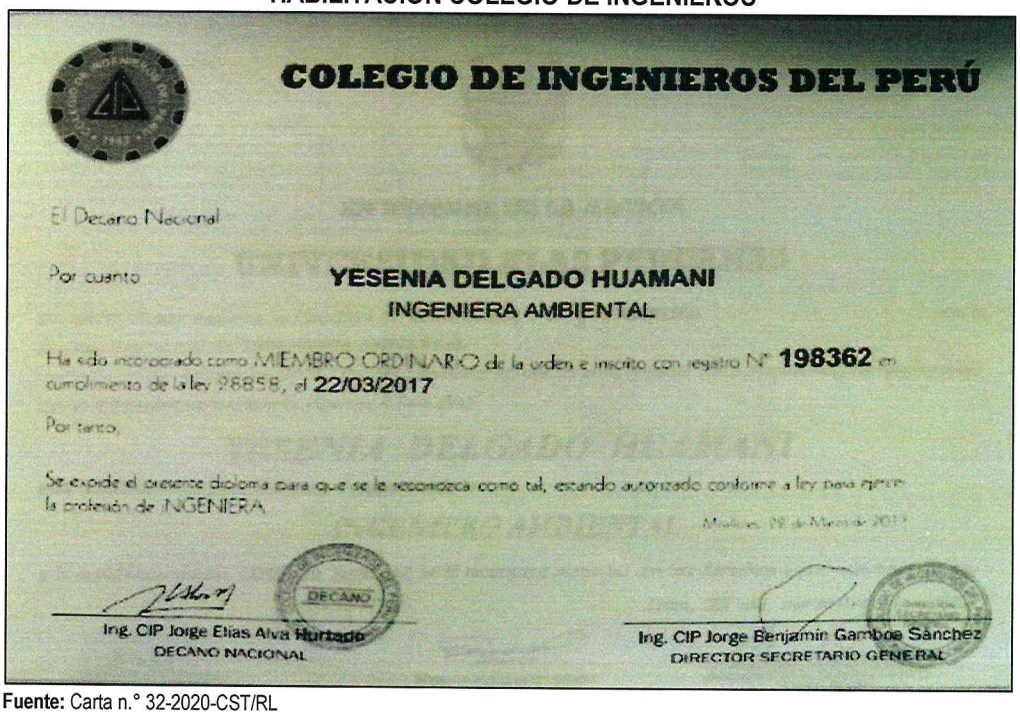

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional

Por cuanto

YESENIA DELGADO HUAMANI
INGENIERA AMBIENTAL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **198362** en cumplimiento de la ley 28858, el **22/03/2017**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERA.

Ing. CIP Jorge Elias Alva Hurtado
DECANO NACIONAL

Ing. CIP Jorge Benjamin Gamboa Sánchez
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL

Fuente: Carta n.° 32-2020-CST/RL

Asimismo, contrastando la documentación adjuntada respecto de la experiencia de Yesenia Delgado Huamani y tomando como referencia la fecha de expedición del título profesional se comprueba hasta la fecha que cuenta con experiencia profesional de 33 meses, conforme a la siguiente descripción:

CUADRO N° 5
EXPERIENCIA PROFESIONAL DE YESENIA DELGADO HUAMANI

N°	EMPLEADOR	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	TIEMPO ACUMULADO
1	Servicios Generales Perching SAC	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	01/01/2017	31/07/2017	7meses
2	LVC Contratistas Generales SAC	Especialista de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente	01/07/2017	31/10/2017	4 meses
3	Servicios Generales Perching SAC	Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	01/11/2017	31/12/2017	2 meses
4	Corporación Kaiser SAC	Especialista de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente	01/01/2018	31/08/2018	8 meses
5	Corporación Kaiser SAC		01/09/2018	31/04/2019	8 meses
6	Consorcio Cocharcas JRCHL EIRL		01/09/2019	31/12/2019	4 meses
EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA					33 MESES

Fuente: Carta n.° 32-2020-CST/RL

Por otro lado, es relevante señalar que la "experiencia" implica el desarrollo de actividades durante un período de tiempo, la misma que, a efectos de ser calificada por la Entidad, se debe tomar en cuenta las condiciones que motivaron la selección del contratista, con las que se adjudicó la buena pro, por lo tanto, se realizó el siguiente cuadro comparativo:

CUADRO N° 6
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia profesional como especialista y/o ingeniero de seguridad de obras en general	
Ing. Wolfgang Augusto Gonzales Espinoza	Ing. Yesenia Delgado Huamani
71 meses	33 meses

Fuente: Carta n.° 32-2020-CST/RL

Conforme se advierte en el cuadro precedente, la Entidad adjudicó la buena pro al consorcio Santo Tomás, respecto del especialista en seguridad de obra, al Ing. Wolfgang Augusto Gonzales Espinoza, quien cuenta con 71 meses de experiencia, sin embargo, la Ing. Yesenia Delgado Huamani, únicamente cumple 33 meses, situación que inobserva las condiciones con las que motivaron la selección del contratista.

El hecho advertido habría inobservado la siguiente normativa:

Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

> **Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado**
>
> 190.2. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal.

190.3. Luego de transcurrido el plazo señalado en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado.

190.4. Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo previsto en los numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista.

Lo descrito anteriormente, genera el riesgo que los trabajos se realicen sin las condiciones de eficiencia y calidad previstas en el expediente técnico.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control **Personal Clave**, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE DE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

HITO DE CONTROL 1 - Informe de Hito de Control n.° 014-2020-OCI/0386-SCC

El Órgano de Control Institucional a través del oficio n.° 212-2020-MPCH/OCI de 15 de octubre de 2020, comunicó al titular de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, el informe n.° 014-2020-OCI/0386-SCC, con la siguiente situación adversa:

> ***"EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID 19, LA OBRA SE EJECUTA INCUMPLIMIENTO LOS PROTOCOLOS SANITARIOS, GENERANDO EL RIESGO DE DISEMINAR EL SARS-COV-2 Y AFECTAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN"***

Al respecto, la Entidad hasta la fecha de emisión del presente informe, no comunicó el plan de acción, que contenga las acciones preventivas o correctivas que implemente la situación adversa descrita.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo Capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco", se ha advertido **una (1) situación adversa** que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos previstos, la cual ha sido detallada en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de control concurrente, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de educación del centro educativo básico alternativo Capitán Felipe Bermúdez en el distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas - Cusco", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a través del plan de acción a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Santo Tomás, 18 NOV. 2020

CESAR WILDOR ORDOÑEZ ENRIQUEZ
Supervisor

JESUS AUGUSTO SALAS MENDOZA
Jefe de Comisión

WALTER AUGUSTO CANO MENDOZA
Integrante Especialista

FRANCISCO DELGADO TAMATA
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19, LA OBRA SE EJECUTA SIN PERSONAL CLAVE, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y GENERANDO EL RIESGO QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN SIN LAS CONDICIONES DE EFICIENCIA Y CALIDAD PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

N°	Documento
1	Acta de Visita inopinada de 16 de octubre de 2020.
2	Términos de referencia del personal clave.
3	Carta n.° 032-2020-CST/RL.
4	Curriculum vitae de Yesenia Delgado Huamaní.

Santo Tomás, 18 NOV. 2020

OFICIO N° 261-2020-MPCH/OCI

Señor(a):
Nadia Liz Pallo Arotaipe
Alcaldesa
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Parque Paliza N° 100
Santo Tomás/Chumbivilcas/Cusco

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
MESA DE PARTES
FECHA: 18 NOV 2020 HORA: 11:05
EXP.: 10.108 FOLIOS: 11
FIRMA

ASUNTO : Comunicación de Informe de Control de Concurrente N° 018-2020-OCI/0386-SCC

REFER. : a) Artículo 8° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República – Ley N° 27785
b) Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobado por Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG publicada el 30 de marzo de 2019, modificado con Resolución de Contraloría N° 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mérito de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada a la **LICITACIÓN PÚBLICALP-SM-1-2019-MPCH-1, EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ALTERNATIVO CAPITAN FELIPE BERMUDEZ EN EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO" con código SNIP n.° 297871**, le comunico que se ha identificado una situación adversa contenida en el informe de control concurrente **n.° 018-2020-OCI/0386-SCC**, que se adjunta en el presente documento.

En tal sentido, solicito remita a este Órgano de Control Institucional ubicada en la Calle Miraflores s/n, edificio Centro Cívico – 4to piso, Santo Tomas – Chumbivilcas, el Plan de Acción correspondiente, **en un plazo de diez (5) días hábiles**, contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUMBIVILCAS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Mgt. Francisco Delgado Tamata
J E F E

CC.
FDT/Archivo
