CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

# INFORME DE HITO DE CONTROL N° 045-2026-OCI/0392-SCC

## CONTROL CONCURRENTE
## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA
## URUBAMBA, URUBAMBA, CUSCO

## "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE RECREACIONAL DE CHARCAHUAYLLA DE LA CIUDAD DE URUBAMBA - DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

## HITO DE CONTROL N° 4 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE JUNIO DE 2026

**PERIODO DE EVALUACIÓN:**
**DEL 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2026**

**URUBAMBA, 24 DE JULIO DE 2026**

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres*
*Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

# INFORME DE HITO DE CONTROL
# N° 045-2026-OCI/0392-SCC

## "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE RECREACIONAL DE CHARCAHUAYLLA DE LA CIUDAD DE URUBAMBA - DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

## HITO DE CONTROL N° 4 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE JUNIO DE 2026

# ÍNDICE

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00


| DENOMINACIÓN | | N° Pág. |
|---|---|---|
| I. | ORIGEN | 3 |
| II. | OBJETIVOS | 3 |
| III. | ALCANCE | 3 |
| IV. | INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL | 3 |
| V. | SITUACIONES ADVERSAS | 7 |
| VI. | DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL | 17 |
| VII. | INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 17 |
| VIII. | INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES | 17 |
| IX. | CONCLUSIÓN | 17 |
| X. | RECOMENDACIONES | 18 |
| APÉNDICE | | 19 |

# INFORME DE HITO DE CONTROL
# N° 045-2026-OCI/0392-SCC

## "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE RECREACIONAL DE CHARCAHUAYLLA DE LA CIUDAD DE URUBAMBA - DISTRITO DE URUBAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

## HITO DE CONTROL N° 4 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA AL MES DE JUNIO DE 2026

## I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Urubamba, en adelante "OCI", con oficio n.° 000476-2025-CG/OC0392 de 5 de diciembre de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental –SCG con la orden de servicio n.° 0392-2026-008, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG "Servicio de Control Simultáneo" aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

## II. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo General

Determinar si la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", se realiza conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

### 2.2 Objetivo Específico

Determinar si la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", durante el mes de junio de 2026, se viene ejecutando y supervisando de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico, normativa técnica aplicable y disposiciones internas.

## III. ALCANCE

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 4: avance de ejecución de obra al mes de junio de 2026, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Urubamba, en adelante la "Entidad", el cual se ejecutó entre el 13 de julio al 17 de julio de 2026, en la obra ubicada en el Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco, por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Urubamba, situado en Jr. Bolívar s/n de la ciudad de Urubamba, Provincia de Urubamba y Departamento de Cusco.

## IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El proyecto de inversión denominado "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", con CUI n.° 2410826, fue registrado en el Banco de Proyecto el 3 de abril de 2018 mediante el "Formato SNIP-03: Ficha de Registro – Banco de Proyectos", formulado por la Unidad formuladora de la Municipalidad Provincial de Urubamba, siendo viable el

19 de abril de 2028 y la encargada de la ejecución de dicha inversión es la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Urubamba.

Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura n.º 035-2024-GI/MPU de 12 de junio de 2024, la gerencia de Infraestructura aprobó el Expediente Técnico de dicho proyecto con un presupuesto de S/12 379 322,98 bajo la modalidad de administración directa con un plazo de ejecución de 420 días calendarios. Actualmente, el estado de la inversión se encuentra "Activo".

La localización del proyecto se muestra en el gráfico siguiente:

**GRAFICO N° 1**
**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

**Detalle:** Imagen satelital de la localización del Proyecto de Inversión Pública.
**Fuente:** Especificaciones técnicas del Expediente técnico del Proyecto de Inversión.

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

## 4.1. Descripción del proyecto de inversión

### a) Objetivo del proyecto de inversión

El proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", en adelante "El Proyecto de inversión", tiene como objetivo brindar óptimas condiciones para los servicios recreativos en el Distrito de Urubamba, especialmente en el "Parque Recreacional Charcahuaylla", incrementando el desarrollo social, cultural y deportivo de la población de la ciudad de Urubamba.

### b) Características del Proyecto de Inversión

El Proyecto de inversión está basado en el diseño, que enmarca a su entorno, contexto, su topografía; considerando también el tipo de clima que presenta espacios cerrados y abiertos, tomando en cuenta las edificaciones tipológicas del lugar, basados al reglamento nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas de Diseño para Áreas recreativas

Según el expediente técnico aprobado, comprende la ejecución de tres (3) componentes: i. Adecuada infraestructura deportiva y recreativa, ii. Suficiente Mobiliario y equipamiento para la

prestación del servicio, iii. Mejoramiento de la gestión del servicio, ejecutado según las siguientes metas físicas:

- **Obras Preliminares**: Incluye las obras previas que deberán realizarse como trazos, replanteos, demoliciones, desmontajes, plan de seguridad covid-19, plan de seguridad ocupacional.
- **Construcción de Bloque de Piscinas y Coberturas**
- **Construcción de Piscina con Cobertura**: Comprende los trabajos que se realizarán para la construcción de la piscina semi olímpica la cual contará con una cobertura de 2 184.00 m$^2$.
- **Construcción de Piscina al Aire Libre**: Se construirán dos piscinas recreativas en un área de 629.56 m$^2$ para la zona de adultos y 238.58 m$^2$ para la zona de niños.
- **Construcción de Cerco Perimétrico, Accesos, Muros y Estacionamiento**: Se construirá el cerco perimétrico que comprende tres tipos, el cerco noreste colindante con la carretera Cusco-Urubamba presentará rejas y estructura de concreto para poder apreciar el interior del establecimiento con una longitud de 230.85 ml, el cerco de Tipo 2 se encuentra ubicado en la Zona Sureste, este será ciego, construido de ladrillo y columnetas y viguetas de concretos, con una longitud de 129.65 m$^2$.
- **Construcción de Ingreso**
- **Construcción de Área de Administración**: Comprende la construcción de la zona administrativa del complejo recreacional en un área construida de 671.67 m$^2$ (2 niveles)
- **Construcción de Plaza Central**: La plaza central contará con una fuente decorativa, el área de intervención es de 695.55m$^2$
- **Construcción de Estacionamiento**: Área a intervenirse 1,614.94 m$^2$
- **Áreas de Circulación, Áreas Verdes**: Se proyecta ejecutar áreas de circulación y áreas verdes con 2 260.23 y 6 6649.50 m$^2$ respectivamente.
- **Construcción de Campo Deportivo**: Comprende la construcción de la tribuna de 4 niveles que incluye áreas de preparación física, palcos, zona de trasmisión y del campo deportivo de césped, con sistema de riego para la conservación del mismo, en un área de 7 227,00 m$^2$.
- **Construcción de Polideportivo y Losa Multiusos**: Comprende la construcción de polideportivo y la losa multiusos en un área de 803.95 m$^2$.
- **Construcción de Baños, Quioscos y Juegos Para Niños**
- **Construcción de Vestidores y Duchas**: Área a intervenir 147,83 m$^2$
- **Implementación de Juegos Infantiles**: Área a intervenir: 437.65 m$^2$
- **Construcción de Cisterna y Sub Estación**: Área a intervenir: 163.49 m$^2$.
- **Instalaciones Electromecánicas Especiales**: Comprende el equipamiento de instalaciones electromecánicas especiales para la plaza central.
- **Implementación de Equipamiento**: Comprende el equipamiento de: piscinas, áreas exteriores, losa de grass sintético, campo deportivo y juegos infantiles.
- **Gestión de Servicio**: La gestión del servicio incluye desarrollo de las capacidades personales programa de sensibilización del servicio y cuidado del centro recreacional.

Asimismo, se puede advertir que, la información registrada en el Banco de Inversiones de la página web de INVIERTE.PE, el monto de la inversión viable del Proyecto de Inversión es de S/ 16 373 742,32 (dieciséis millones trecientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y dos con 32/100), distribuido de la siguiente manera:

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

**CUADRO N° 1**
**COSTO TOTAL DEL EXPEDIENTE EJECUTADO**

| Descripción de productos/acciones | Costos de Inversión (S/) | Fecha | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Inicio | Término | Entrega OYM |
| **1. Adecuada infraestructura deportiva y recreativa** | | | | |
| Remodelación de infraestructura deportiva | 14 200 422,17 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| **2. Suficiente mobiliario y equipamiento para la prestación del servicio** | | | | |
| Implementación de piscina deportiva (recreativa | 55 919,32 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| Implementación de espacio exterior | 55 830,00 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| Implementación de losa deportiva: equipamiento para la losa múltiple | 6 600,00 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| Implementación de espacio deportivo abierto: equipamiento de campo deportivo | 8 330,00 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| Implementación de juegos infantiles e inclusivos: equipamiento de juegos infantiles | 38 800,00 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| **3. Mejoramiento de la gestión del servicio** | | | | |
| Capacitación de capacidad humana: desarrollo de las capacidades de personal | 18 000,00 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| Capacitación de capacidad humana: programa de sensibilización del servicio y cuidado del centro recreacional | 12 000,00 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| **Subtotal** | **14 395 901,49** | | | |
| Gestión del proyecto | 1 262 227,94 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | |
| Expediente técnico | 191 500,00 | 01/10/2023 | 24/09/2025 | |
| **Supervisión** | 504 737,13 | 01/08/2024 | 30/09/2026 | |
| Liquidación | 19 375,76 | 01/08/2024 | 01/05/2028 | |
| **Costo de inversión actualizado:** | **16 373 742,32** | | | |

**Fuente**: Formato n.° 08-C del Seguimiento de Inversiones MEF (Consulta: 24 de julio de 2026), obtenido en: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/ejecucion/verFichaEjecucion/2410826.
**Elaborado por:** Comisión de control a cargo de control concurrente.

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

## 4.2. Inicio y avance del proyecto de Inversión

El proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", en adelante "la Obra", inició el 19 de setiembre de 2024 según Acta de Inicio de Obra, siendo la fecha prevista de culminación el 4 de marzo de 2026; sin embargo, la Obra fue paralizada temporalmente por el cierre del año fiscal 2024 y reinició la Obra el 23 de enero de 2024 conforme señala en el Acta de reinicio de obra suscrito por el Gerente de Infraestructura, Inspector de Obra y el Residente de Obra.

Posterior a ello, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura n.° 056-2025-GI/MPU de 17 de diciembre de 2025 la Gerencia de Infraestructura aprobó el expediente Modificado en la Etapa de Ejecución Física n.° 03 por Ampliación presupuestal n.° 1; debido a, la actualización de precios, mayores metrados, partidas nuevas y deductivos; es así que, el presupuesto actualizado asciende a S/16 701 217,17, con ampliación de plazo de 112 días calendario.

Por otro lado, de la revisión al Formato n.° 12-B "Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones", se evidencia el registro de inicio y culminación de la ejecución física planeado en el cronograma de 19 de setiembre de 2024 y 30 de setiembre de 2026, respectivamente; sin embargo, el registro de avance de la ejecución física de la inversión a junio de 2026 es 38.7%; respecto, al avance financiero acumulado es de 62.4%, a la fecha la obra se viene ejecutando bajo de dirección técnica del ingeniero Luis Rimachi Zarabia como residente de Obra y el ingeniero Samuel Miranda Farfán como inspector de Obra.

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la documentación e información relacionada a la ejecución de la obra al mes de junio de 2026, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión "*Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco*", las cuales se detallan a continuación:

### 5.1. INADECUADAS CONDICIONES DE LOS AGREGADOS Y FALTA DEL TRATAMIENTO PREVIO PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO, PONEN EN RIESGO LA CALIDAD Y RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA Y CUARTO DE BOMBAS, LO CUAL COMPROMETERÍA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Durante la visita de inspección a la obra realizada el 13 de julio de 2026[1], la comisión de control verificó que se ejecutaban los encofrados de las ménsulas destinadas a soportar la estructura metálica de la cobertura de la piscina semiolímpica (con una luz de aproximadamente 33 m); así como, las vigas del cuarto de bombas. Asimismo, el residente de obra informó que dichos elementos serían vaciados con un volumen superior a 55 m³ de concreto[2], elaborado en obra. De igual forma, de la revisión del expediente técnico se verificó que el concreto estructural considerado para dichos elementos corresponde a una resistencia de diseño de f'c = 210 kg/cm², que coindice con lo precisado por el residente de obra[3].

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Nos 1 Y 2**
**ESTADO DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PISCINA S.O Y CUARTO DE BOMBAS**

**Fuente:** Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026.

En relación al proceso constructivo, la residencia informó que el concreto será elaborado in situ, con los materiales existentes en obra. Al respecto, de la verificación a dichos materiales se advirtieron las siguientes observaciones en los agregados:

1 Conforme consta en el Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026, suscrito por el Residente, Inspector de Obra; así como, los integrantes de la Comisión de Control.
2 Conforme lo informado por la residencia de obra, quedaría pendiente el vaceado de 45,78 m³ en la piscina semiolímpica y 9,37 m³ en el cuarto de máquinas.
3 Conforme consta en el Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026, suscrito por el Residente, Inspector de Obra; así como, los integrantes de la Comisión de Control.

- **Agregado Fino (arena gruesa):**

En relación al agregado fino se sacó una muestra de manera aleatoria, donde se observó visualmente que la arena presenta evidente exceso de material fino; además, presencia de material granular con tamaño de hasta ½"[4], aun cuando los limites considerados para agregado fino indican que el 100% debería de pasar el tamiz de 3/8", según lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP.400.037, "*Agregados para concreto, requisitos*", condición que también le era exigible en las especificaciones técnicas correspondientes al pedido de compra n.° 001320[5], conforme se evidencia a continuación:

**REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 3**
**MUESTRA ALEATORIA DE LA ARENA**

**Fuente:** Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 4**
**ACOPIO DE AGREGADOS EN OBRA CON PRESENCIA DE MATERIAL ORGÁNICO**

**Fuente:** Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026.

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

4 Medición en una cara.
5 Mediante el Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026, se solicitó la documentación correspondiente a la compra de los agregados, siendo que la residencia de obra entregó la documentación correspondiente a la Orden de compra n.° 0000071 de 5 de marzo de 2025, mediante el cual se adquirió arena fina, arena gruesa y hormigón.

- **Agregado grueso (piedra chancada):**

Situación similar se advirtió en el agregado grueso, donde al momento de la extracción de muestra aleatoria se verificó a simple vista que la piedra presentaba evidente exceso de material fino; asimismo, se identificó visualmente la presencia de partículas con tamaños de hasta 1"[6], tamaño superior al requerido por la residencia de obra que, según las especificaciones técnicas correspondientes al pedido de compra n.° 001328[7], el 100% del material debería pasar el tamiz de ¾", según se muestra a continuación:

**REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 5**
**MUESTRA ALEATORIA DE LA PIEDRA**

**Fuente:** Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 6**
**PRESENCIA DE MATERIAL FINO DURANTE LA EXTRACCIÓN DEL PIEDRA**

**Fuente:** Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026.

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

6 Medición en una cara.
7 Mediante el Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026, se solicitó la documentación correspondiente a la compra de los agregados, siendo que la residencia de obra entregó la documentación correspondiente a la Orden de compra n.° 0000150 de 12 de marzo de 2026, mediante el cual se adquirió piedra chancada de ½".

Lo expuesto, también fue advertido en el diseño de mezclas, donde se establece la necesidad de realizar tratamientos previos a los agregados antes de su uso, conforme el detalle siguiente:

> *"1 LA ARENA PARA SER USADO INICIALMENTE DEBE SER ZARANDEADA Y SEPARAR EL TAMAÑO MAYOR A 3/8"*
> *2 LA ARENA DEBE SER LAVADA.POR SU ALTO GRADO DE IMPUREZAS QUE ALCANZA AL 8.39% ... >5%*
> *3 LA GRAVA DEBE SER LAVADA, POR ESTAR SERCA AL LIMITE PERMITIDO EL GRADO DE IMPUREZAS = 4.39%"*

Sin embargo, de la revisión al cuaderno de obra y al informe de control de calidad, correspondiente al mes de junio de 2026, no se evidencia anotaciones que la residencia haya realizado el zarandeo y lavado de los agregados; así tampoco, se aprecia que el inspector de obra haya constatado su realización durante el procedimiento de elaboración de concreto, lo que genera incertidumbre en la calidad y resistencia del concreto.

Esta condición se hace especialmente critica en el concreto que ira en las ménsulas; toda vez que, durante la visita de inspección realizada, se observó una alta densidad de acero de refuerzo en dichos elementos, con espaciamientos libres entre barras menores a 2 cm (0.79"), condición que, sumada a la condición de los agregados, incrementa considerablemente el riesgo de segregación y formación de cangrejeras durante el vaciado. Al respecto, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma E.060 Concreto Armado, establece lo siguiente: *"El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de: (...) c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos*."

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Nos 7 Y 8**
**ESTADO DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PISCINA S.O Y CUARTO DE BOMBAS**

**Fuente:** Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026

Las situaciones expuestas evidencian el uso de agregados que no cumplen con las especificaciones técnicas ni con la normativa aplicable, sumado a la omisión de los tratamientos previstos en el diseño de mezclas y la falta de control de calidad; situación que, genera el riesgo de afectar la calidad y resistencia del concreto; lo cual, compromete la seguridad estructural y la vida útil del proyecto.

Al respecto, la normativa pertinente señala lo siguiente:

- **Norma Técnica Peruana NTP.400.037, "Agregados para concreto, requisitos", aprobada con Resolución Directoral n.° 002-2018-INACAL/DN de 2 de febrero de 2018.**

*"**AGREGADO FINO***
*(…)*
***5 Granulometría***
***5.1 Análisis granulométrico:** El agregado fino, excepto lo indicado en los apartados 5.2 y 5.3 debe tener la granulometría según los límites de la Tabla 1:*
*(…)*

***TABLA 1 – Requerimiento de granulometría para agregado fino***

| *Tamiz* | *Porcentaje que pasa* |
|---|---|
| *9,5 mm (3/8 pulg)* | *100* |
| *4,75 mm (No. 4)* | *95 a 100* |
| *2,36 mm (No. 8)* | *80 a 100* |
| *1,18 mm (No. 16)* | *50 a 85* |
| *600 µm (No. 30)* | *25 a 60* |
| *300 µm (No. 50)* | *5 a 30* |
| *150 µm (No. 100)* | *0 a 10* |
| *75 µm (No. 200)* | *0 a 3,0* |

*(…)*
*6 Sustancias nocivas*
*6.1 La cantidad de sustancias nocivas del agregado fino no deberá exceder de los límites establecidos en la Tabla 2:*

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

***TABLA 2 – Límites de sustancias nocivas en el agregado fino para concreto***

| *Ensayo* | *Porcentaje total de la muestra (max.)* |
|---|---|
| Terrones de arcilla y partículas friables | *3,0* |
| Material más fino que la malla normalizada 75 µm (No. 200): | *3,0* |
| • Concreto sujeto a abrasión | *5,0* |
| • Otros concretos | |

*(…)".*

- **Directiva n.° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de obras públicas por administración directa", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 432-2023-CG de 22 de diciembre de 2023**

*"**6.8.3 Inspector o Supervisor de Obra***
*El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado por esta para controlar los trabajos efectuados por el personal profesional y técnico a cargo de la ejecución de la obra pública.*
*(…)*
*El inspector o supervisor es el responsable de velar permanentemente por el cumplimiento de lo establecido en los documentos del expediente técnico de obra y normas técnicas aplicables; y, cumple principalmente las funciones siguientes:*
*(…)*
*d) Aprobar la conformidad técnica de los trabajos ejecutados, de la calidad de los materiales utilizados y de la calidad de mano de obra utilizada.*
*(…)*

***7.3.5 Control de calidad durante la ejecución de obra***
*Durante la ejecución de la obra, deben realizarse las pruebas de control de calidad que están destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, según su naturaleza y complejidad.*
*(…)*
*En los informes mensuales del Residente y el Inspector o Supervisor de obra, obligatoriamente se adjuntan todas las pruebas y protocolos de control de calidad certificada por los especialistas o la certificación de los laboratorios acreditados. La OAD debe realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión."*

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

- **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma E.060 *Concreto Armado, aprobado con Decreto Supremo n.° 015-2004-VIVIENDA de 6 de setiembre de 2004***

*"**CAPÍTULO 3***
***MATERIALES***
***(...)***
***3.3 AGREGADOS***
*(…)*
*3.3.2 El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de:*
*a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado.*
*b) 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso.*
*c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.*
*Estas limitaciones se pueden omitir si se demuestra que la trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de vacíos o "cangrejeras".*
*(…)*
*3.3.6 El agregado fino podrá consistir de arena natural o manufacturada, o una combinación de ambas. Sus partículas serán limpias, de perfiles preferentemente angulares, duros, compactos y resistentes. Deberá estar libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas.*
*3.3.7 El agregado grueso podrá consistir de grava natural (piedra zarandeada) o triturada (piedra chancada) o una combinación de ambas y deberá estar libre de partículas escamosas, materia orgánica u otras sustancias dañinas. En el agregado triturado las partículas serán limpias, de perfil*

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

*preferentemente angular o semi-angular, duras, compactas, resistentes y de textura preferentemente rugosa. En el agregado natural las partículas serán limpias, duras, compactas, resistentes, pudiendo ser redondeadas y de textura lisa.*
*3.3.8 La granulometría seleccionada para el agregado deberá permitir obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla.*
*El parámetro numérico de control de la granulometría tanto para el agregado fino como el grueso o la combinación de ambos será el Módulo de Fineza. Se admite una tolerancia de +- 0.2 en el Módulo de Fineza sin necesidad de requerir ajustes en la granulometría o en la mezcla de concreto.*
*3.3.9 El lavado de los agregados se deberá hacer con agua potable o agua libre de materia orgánica, sales y sólidos en suspensión.*
*(…)*

***3.7 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES***
*3.7.1 El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materias extrañas.*
*3.7.2 Ningún material que se haya deteriorado o contaminado debe utilizarse en la elaboración del concreto.*
*(…)*
*3.7.4 Los agregados se almacenarán o apilarán de manera de impedir la segregación de los mismos, su contaminación con otros materiales o su mezcla con agregados de características diferentes.*
*(…)".*

Los hechos descritos ponen en riesgo la calidad y resistencia del concreto en los elementos estructurales de la piscina semiolímpica y cuarto de bombas, lo cual compromete la seguridad estructural y vida útil del proyecto

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

**5.2. ENTIDAD NO ACTUALIZA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO N° 12-B DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI) Y MANTIENE ALERTAS DE RIESGO SOBRE LA CONSISTENCIA DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO MONITOREO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.**

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

De las consultas realizadas en el SSI (Sistema de Seguimiento de Inversiones), aplicación informática de Inversión Pública y de acceso público del Ministerio de Economía y Finanzas a las inversiones en estado "Activas" se ha podido identificar alertas de riesgo en los proyectos de Inversión Pública.

Al respecto la Directiva n.° 001-2019-EF/63.01 denominada "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"[8], establece que las inversiones acceden a la fase de ejecución del ciclo de inversión, o la aprobación, tratándose de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR), siempre que se encuentren registradas en el Programa Multianual de Inversiones (PMI). Esta fase comprende tanto la elaboración del expediente técnico o documento equivalente como la ejecución física de las inversiones.

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

Asimismo, la referida directiva dispone que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) debe registrar mensualmente la información sobre el seguimiento de la ejecución de cada Inversión en el Formato n.° 12-B "Seguimiento a la ejecución de inversiones", dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente. Según el instructivo del Formato n.° 12-B, publicado por el Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, esta herramienta permite consignar

[8] Aprobada por la Resolución Directoral n.° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral n.° 005-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 24 de marzo de 2020, por la Resolución Directoral n.° 006-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 19 de julio de 2020; por la Resolución Directoral n.° 008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 28 de octubre de 2020; por la Resolución Directoral n.° 0004-2022-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 17 de setiembre de 2022, y por la Resolución Directoral n.° 0002-2025-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 01 de febrero de 2025.

información relacionada con las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección para la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, la ejecución física de la inversión y la programación financiera correspondiente.

Al respecto, de la consulta efectuada el 22 de julio de 2026 al aplicativo Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto del proyecto de inversión "*Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco*", con CUI n.° 2410826, se advirtió la existencia de una alerta vinculada a la actualización del Formato n.° 12-B, señalando que la inversión no cuenta con dicho formato actualizado, conforme se aprecia en la imagen siguiente:

**IMAGEN N° 1**
**HISTORIAL DE LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN CON CUI N° 2410826**

**Fuente:** Formato n.° 12-B "Sistema de Seguimiento a las Inversiones (SSI)" consultado el 18 de junio de 2026 en el siguiente enlace URL "https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2579065"

Tal como se observa en la imagen precedente se emitió la alerta indicando que la obra no cuenta con formato n.° 12-B actualizado; asimismo, se advirtió que la última actualización del Formato n.° 12-B: Seguimiento a la Ejecución de Inversiones, corresponde al 17 de junio de 2026, no evidenciándose el registro de la información correspondiente al mes de mayo de 2026, pese a haber vencido el plazo previsto para su actualización; conforme se observa a continuación:

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

**IMAGEN N° 2**
**FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO N° 12-B DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES**

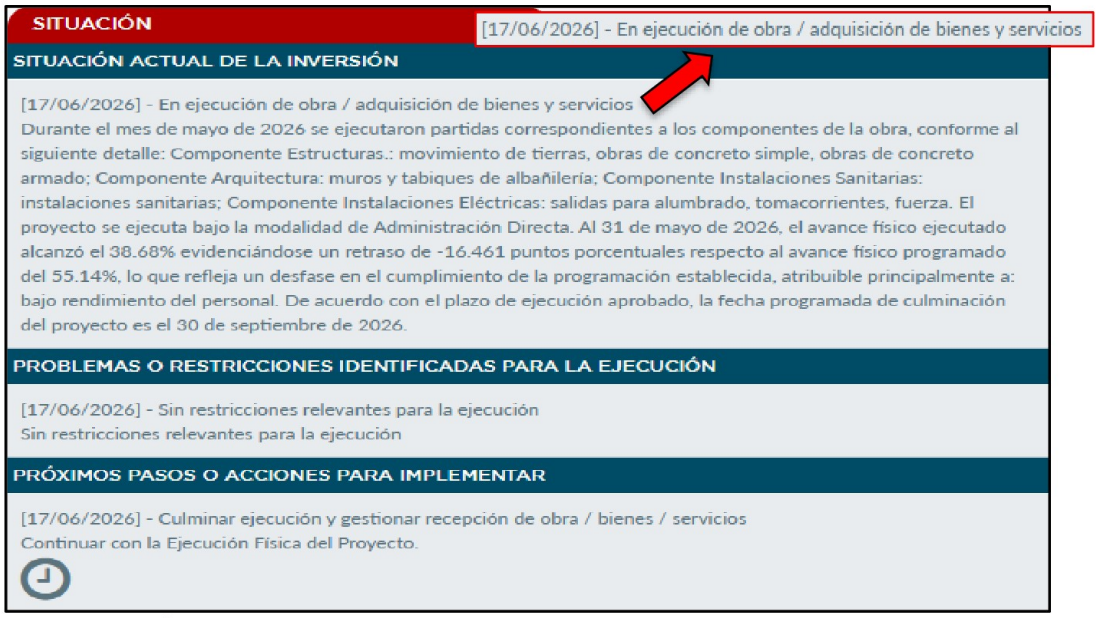


**Fuente:** Formato n.° 12-B "Sistema de Seguimiento a las Inversiones (SSI)" consultado el 22 de julio de 2026 en el siguiente enlace URL "https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2579065"

Al respecto, conforme a lo establecido en el numeral 45.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión debe ser registrada mensualmente por la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el Formato n.° 12-B, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente. En ese sentido, considerando que el plazo para registrar la información correspondiente al mes de junio de 2026 venció el 14 de julio de 2026, la entidad no habría efectuado oportunamente la actualización de la información de la inversión en el referido aplicativo.

Asimismo, se advirtió que el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) registra la alerta de riesgo denominada "Inconsistencia entre la ejecución financiera y física (superior al 20%)", la cual señala que una diferencia superior al citado porcentaje genera el riesgo de que los recursos financieros no se conviertan oportunamente en activos, afectando directamente el avance físico y el cumplimiento de los objetivos de la inversión tal como se muestra en la imagen siguiente:

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

**IMAGEN N° 3**
**ALERTA DE INCONSISTENCIA ENTRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DE LA INVERSIÓN CON CUI N° 2410826**

**Fuente:** Formato n.° 12-B "Sistema de Seguimiento a las Inversiones (SSI)" consultado el 22 de julio de 2026 en el siguiente enlace URL "https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/ResumF12B?codigo=2579065"

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

En efecto, conforme a la información proporcionada por la propia Entidad, el proyecto registra un avance físico de 38,68% y un avance financiero de 62,4%[9], existiendo una diferencia de 23,72%, según la información generada por el SSI y evidencia una brecha significativa entre el progreso físico alcanzado y los recursos financieros ejecutados.

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

La situación descrita podría afectar la calidad y oportunidad de la información utilizada para el monitoreo y seguimiento de la inversión, limitando la adecuada toma de decisiones para la culminación del proyecto, así como la transparencia respecto del uso de los recursos públicos.

El hecho expuesto contraviene la normativa vigente aplicable, que se detalla a continuación:

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

- **Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicado el 1 de diciembre de 2016 y modificatorias.**

  *"**Artículo 3.- Principios rectores***
  *La programación multianual de inversiones y la ejecución de los proyectos de inversión respectivos se sujetan a los principios rectores siguientes:*
  *(...).*
  *k) (...) En la gestión de la inversión sebe realizarse aplicando mecanismos que promueven la mayor transparencia y calidad a través de la competencia".*
  *Artículo 11. El Seguimiento y evaluación de las Inversiones*
  *(...).*
  *11.3 Corresponde a la Unidades Ejecutoras de Inversiones registrar y actualizar la información del avance físico y financiero de todos los componentes de las inversiones a su cargo en el formato de seguimiento del aplicativo informático del Banco de Inversiones, de manera mensual, conforme a las disposiciones establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. La información registrada es considerada para la Programación Multianual de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual es utilizada a su vez para la Programación Multianual Presupuestaria en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público.*
  *(…)".*

[9] Información del aplicativo SSI https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/RepEstimac?codigo=2410826

- **Directiva n.° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral n.° 001-2019-EF-63.01 de 23 de enero de 2019 y modificatorias.**

  *"**Artículo 29.- Inicio y alcance de la fase Ejecución***
  *(...).*
  *29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de ejecución debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en l presente directiva (...).*
  ***Artículo 33. Ejecución física de inversiones***
  *33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponde, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que corresponde en el Banco de Inversiones.*
  *(...).*
  *33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes*
  *(...).*
  ***Artículo 45. Seguimiento de la fase de Ejecución***
  *(...).*
  *45.1 El seguimiento de las inversiones está a cargo de la OPMI, la que puede solicitar la información que considere necesaria a los órganos o dependencias respectivos en cada fase del Ciclo de inversión. (...).*
  *45.3 La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la UEI en el Formato n. 12-B: Seguimiento a la Ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente (...)".*

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

La situación descrita podría afectar el adecuado monitoreo, seguimiento a la ejecución de las inversiones por parte de la ciudadanía.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 4 "Avance de ejecución de obra al mes de junio de 2026", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida de la Comisión de Control; la cual, ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

## VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

## VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

## IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.° 4: Avance de ejecución de obra al mes de junio de 2026, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la

continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al "Avance de ejecución de obra al mes de junio de 2026", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión "Mejoramiento de los Servicios del Parque Recreacional de Charcahuaylla de la Ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco".

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Urubamba, 24 de julio de 2026

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2026 13:04:23 -05:00

**Ítalo Rozas Butrón**
Supervisor
Comisión de Control

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2026 13:01:13 -05:00

**Wendy Yemira Flores Santa Cruz**
Jefa de Comisión

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2026 12:56:03 -05:00

**Ruth Katerin Labra Zuñiga**
Especialista
Comisión de Control

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2026 13:04:37 -05:00

**Ítalo Rozas Butrón**
Jefe del Órgano de Control Institucional
**Municipalidad Provincial de Urubamba**
Contraloría General de la República

# APÉNDICE N° 1

## DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. **INADECUADAS CONDICIONES DE LOS AGREGADOS Y FALTA DEL TRATAMIENTO PREVIO PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO, PONEN EN RIESGO LA CALIDAD Y RESISTENCIA DEL CONCRETO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA Y CUARTO DE BOMBAS, LO CUAL COMPROMETERÍA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Acta n.° 001-2026-OCI/MPU-SCC4-CUI 2410826 de 13 de julio de 2026 |
| 2 | Diseño de mezclas |
| 3 | Pedido de compra n.° 001320 |
| 4 | Pedido de compra n.° 001328 |
| 5 | Informe mensual correspondiente al mes de junio de 2026 |

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

2. **ENTIDAD NO ACTUALIZA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO N° 12-B DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI) Y MANTIENE ALERTAS DE RIESGO SOBRE LA CONSISTENCIA DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO MONITOREO, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.**

| N° | DOCUMENTO |
|---|---|
| 1 | Sistema de Seguimiento a las Inversiones (SSI) consultado el 22 de julio de 2026 en el siguiente enlace URL (https://ofi5.mef.gob.pe/invierteWS/Repseguim/RepEstimac?codigo=2410826) |

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

## APÉNDICE N° 2
## INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

### Hito de Control n.° 3:

**Avance de ejecución de obra al mes de marzo de 2026**
Informe de Hito de Control n.° 027-2026-OCI/0392-SCC de 12 de mayo de 2026.

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| N° | Situación adversa | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la Situación Adversa |
|---|---|---|---|
| 1 | La ejecución de la obra no estaría considerando lo indicado en el estudio de evaluación de riesgos, en relación a la omisión de medidas de protección ribereña y ancho de la faja marginal del río Vilcanota, lo cual pondría en riesgo la infraestructura del proyecto a peligros de inundación, comprometiendo su vida útil y sostenibilidad; así como, la posibilidad de sanciones por parte de las autoridades competentes. | Mediante Oficio n.° 491-2026-GM/MPU de fecha 3 de junio de 2026, la Gerencia Municipal remitió el Informe n.° 1305-2026-VZA-G.I.-MPU de fecha 28 de mayo de 2026, emitido por el Gerente de Infraestructura, quien a su vez adjuntó el Informe n.° 17-2026-IPI-EE/RO-MPU de fecha 24 de mayo de 2026, elaborado por el Especialista en Estructuras. En dicho documento, el área técnica reconoce la faja marginal de 15 metros de la Resolución n.° 176-2007-INRENA y propone incluir en las modificaciones del expediente técnico una propuesta de intervención para la protección ribereña. | Con acciones |
| 2 | La ejecución de trabajos de carácter estructural que no se encuentran en el expediente técnico, ni aprobadas por la Entidad, generarían el riesgo de falta de disponibilidad presupuestal al no garantizar que los recursos asignados cubran las modificaciones realizadas en campo, lo cual podría conllevar a una paralización de la obra. | Mediante Oficio n.° 491-2026-GM/MPU de fecha 3 de junio de 2026, la Gerencia Municipal remitió el Informe n.° 1305-2026-VZA-G.I.-MPU del 28 de mayo de 2026 y el Informe n.° 17-2026-IPI-EE/RO-MPU del 24 de mayo de 2026. En estos actuados, el Especialista en Estructuras sustenta las modificaciones técnicas aplicadas en obra a nivel estructural, informando que el trámite administrativo para su formalización técnica y legal se encuentra en curso. | Con acciones |
| 3 | Extintores vencidos en la obra representarían un riesgo de inoperatividad ante un incendio, comprometiendo la seguridad de los trabajadores, así como la protección de los bienes e infraestructura de la obra. | Mediante Oficio n.° 491-2026-GM/MPU de fecha 3 de junio de 2026, la Entidad alcanzó el Informe n.° 253-2026-MPU/GI/LRZ-RO, mediante el cual la residencia de obra comunicó que se vienen ejecutando y coordinando las acciones correspondientes para el mantenimiento, recarga y actualización de los extintores observados en las zonas de almacén. | Con acciones |

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

### Hito de Control n.° 2:

**Avance de ejecución de obra al mes de marzo de 2026**
Informe de Hito de Control n.° 015-2026-OCI/0392-SCC de 19 de marzo de 2026.

1. Número de situaciones adversas identificadas: 4
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| Nº | Situación adversa | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la Situación Adversa |
|---|---|---|---|
| 2 | Ejecución de la obra con un expediente técnico que no contaría con la totalidad de la documentación técnica, tales como especificaciones técnicas y sustento del dimensionamiento de canales de riego (estudios hidrológicos y diseño hidráulico), lo que generaría el riesgo de que se trabaje sin directrices ni parámetros de calidad; así como, posibles secciones de canal insuficientes, lo que podría conllevar a deficiencias constructivas que afecten la calidad, funcionalidad y vida útil de la obra. | Con oficio n.° 386-2026-GM/MPU de 27 de abril de 2026, la Gerencia Municipal remite el informe n.° 976-2026-VZA-G.I.-MPU de la Gerencia de Infraestructura, donde adjuntaron el informe n.° 192-2026-MPU/GI/LRZ-RO de 22 de abril de 2026, mediante el cual el residente de obra informó sobre las acciones que se están adoptando e indicó que, en relación a la ausencia de especificaciones técnicas en el expediente técnico, el residente de obra indicó que la observación está relacionada al Expediente Técnico Modificado N°03, elaborado y aprobado por personal técnico que laboró el año 2025. Sin embargo, *"en aras de garantizar la correcta ejecución de la obra, el equipo técnico actual asumirá la elaboración y complementación de las especificaciones técnicas observadas, asegurando su concordancia con el expediente aprobado y el cumplimiento de la normativa vigente"*. De otro lado, en relación a la falta de sustento técnico respecto del dimensionamiento del canal de evacuación de aguas pluviales, el residente de obra indicó que *"se viene elaborando el sustento técnico correspondiente, a fin de garantizar una solución hidráulica adecuada que asegure la correcta conducción del caudal y evite posibles desbordamientos, contribuyendo a la funcionalidad y seguridad de las obras proyectadas"*. | Con acciones |
| 4 | Falta de licencia de construcción y funcionamiento de la obra; así como, la aprobación sanitaria emitida por la autoridad de salud de la jurisdicción, podría ocasionar paralización y retraso en su culminación. | Con oficio n.° 386-2026-GM/MPU de 27 de abril de 2026, la Gerencia Municipal remite el informe n.° 976-2026-VZA-G.I.-MPU de la Gerencia de Infraestructura, donde adjuntaron el informe n.° 192-2026-MPU/GI/LRZ-RO de 22 de abril de 2026, mediante el cual el residente de obra informó sobre las acciones que se están adoptando e indicó que, el equipo técnico viene gestionando activamente los trámites administrativos necesarios para la obtención de la licencia de construcción y funcionamiento antes la Municipalidad Provincial de Urubamba, así como el documento de aprobación sanitaria ante la autoridad de salud competente de la jurisdicción, con el objetivo de regularizar esta condición en el más breve plazo posible. | Con acciones |

Firmado digitalmente por LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES SANTA CRUZ Wendy Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

## Hito de Control n.° 1:

**Avance de ejecución de obra al mes de diciembre de 2026**
Informe de Hito de Control n.° 001-2026-OCI/0392-SCC de 05 de enero de 2026

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

| Nº | Situación adversa | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la Situación Adversa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dos piscinas recreativas planteadas en el expediente técnico que se encuentra en ejecución no cumplen con lo establecido en la norma aplicable, situación que pone en riesgo el correcto funcionamiento del proyecto | Con oficio n.° 367-2026-GM/MPU de 17 de abril de 2026, la Gerencia Municipal remite el informe n.° 885-2026-VZA-G.I.-MPU de la Gerencia de Infraestructura, donde adjuntan el informe n.° 180-2026-MPU/GI/LRZ-RO de 15 de abril de 2026, mediante el cual el residente de obra informó que la falta de disponibilidad presupuestal para la incorporación de las mejoras planteadas en el informe de hito de control, dentro del expediente modificado n.° 04, limita la adopción de acciones correctivas | No corregido |

| Nº | Situación adversa | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la Situación Adversa |
|---|---|---|---|
| | | frente a las observaciones identificadas. Sin embargo, la situación adversa ya está fuera de plazo para su corrección, por lo que corresponde asignarle el estado de no corregido. | |

Firmado digitalmente por
LABRA ZUÑIGA Ruth Katerin
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 12:55:10 -05:00

Firmado digitalmente por
FLORES SANTA CRUZ Wendy
Yemira FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:00:33 -05:00

Firmado digitalmente por
ROZAS BUTRON Italo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2026 13:04:55 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ROZAS BUTRON Italo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2026 11:05:30 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres*
*Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

Urubamba, 24 de Julio de 2026

# OFICIO N° 000484-2026-CG/OC0392

Señor:
**Ronald Vera Gallegos**
Alcalde
**Municipalidad Provincial de Urubamba**
Plaza de Armas S/N
**Urubamba/Urubamba/Cusco**

**Asunto** : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 045-2026-OCI/0392-SCC.

**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, publicada el 31 de mayo de 2022 y modificatorias.

---

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la Obra "Mejoramiento de los servicios del parque recreacional de Charcahuaylla de la ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", respecto al "Hito de control n.° 4 – Avance de ejecución de obra al mes de junio de 2026" comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 045-2026-OCI/0392-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Urubamba, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
**Italo Rozas Butron**
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Urubamba
Contraloría General de la República

(IRB/fhh)
Nro. Emisión: 00525 (0392 - 2026) Elab:(U19723 - L480)

96 AÑOS 1930 - 2026
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **KUCFQQT**

Firmado digitalmente por TITO CESPEDES Miguel Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05-08-2026 17:13:09 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000051-2026-CG/MPUC

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 00484-2026-CG/OC0392 |
| **EMISOR** | : | ITALO ROZAS BUTRON - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| **DESTINATARIO** | : | RONALD VERA GALLEGOS |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA |
| **DIRECCIÓN** | : | CASILLA ELECTRÓNICA N° 20147567449 |
| **TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** | : | SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL |
| **N° FOLIOS** | : | 23 |

---

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Serviciode Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la Obra "Mejoramiento de los servicios del parque recreacional de Charcahuaylla de la ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", respecto al "Hito

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000484-2026-OC0392
2. Inf

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AG5OVW7**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05-08-2026 17:14:21 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 00484-2026-CG/OC0392 |
| **EMISOR** | : | ITALO ROZAS BUTRON - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| **DESTINATARIO** | : | RONALD VERA GALLEGOS |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA |

---

Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Serviciode Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la Obra "Mejoramiento de los servicios del parque recreacional de Charcahuaylla de la ciudad de Urubamba - Distrito de Urubamba - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco", respecto al "Hito

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20147567449**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000051-2026-CG/MPUC
2. OFICIO-000484-2026-OC0392
3. Inf

**NOTIFICADOR** : MIGUEL MANUEL TITO CESPEDES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AMXUX5Z**
